


平成29年度 緊急予防治山事業第3号工事 小海町 字 本間上

工事名	平成29年度 緊急予防治山事業 第3号工事
工事箇所	南佐久郡 小海町 字 本間上
工事概要	治山土工 670m ³ 法枠工 131m 吹付工 115m ²
工事期間	平成29年6月20日～平成30年1月22日

■平面図

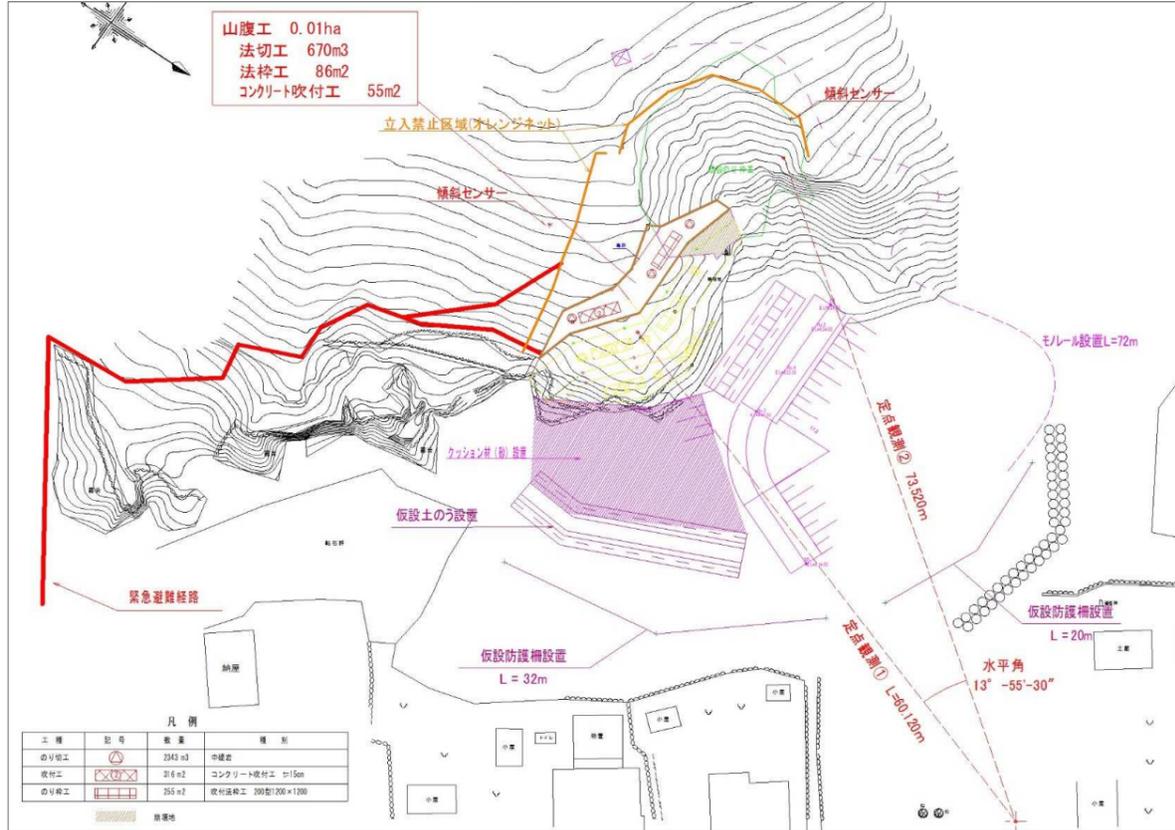

■現場経過

日付	作業内容	備考
7月14日	工事着手	
7月17日	①3D起工測量・現地調査	
7月31日		8/3 安全祈願祭
8月4日	丁張検査	8/4 仮設防護柵位置現地立会、発注者・地権者
8月7日	③仮設防護柵・大型土のう・クッション砂設置	
9月14日	並行して避難経路整備	②8/21小諸労働基準監督署 武藤氏来現
9月15日	工専用モルル架設	
9月27日	④RCM-06搬入 立木アンカー引張強度試験実施	
9月28日	RCM主ワイヤー架設	
9月29日	⑤RCM施工箇所登坂搬入	
10月4日	RCM掘削開始	
10月6日	⑥斜面変位監視システム設置・観測開始	⑦10/6 法面の土質確認依頼 発注者来現
10月18日	⑧現在掘削中	

②労基署 武藤氏来現 (避難経路設置状況視察)



④アンカー引張強度試験実施



③仮設安全施設 (丸太防護柵・大型土のう・クッション砂) 設置完了



⑤RCM-06登坂搬入



⑥斜面監視システム設置



⑦法面土質確認



⑧RCM掘削状況



工事情報配信中

(http://www.takaju-k.com/?page_id=868)



お手持ちのスマホにQRコード読み取りアプリがなければ、iPhoneは「App Store」から、Androidは「Google play」からインストールしてください。「QRコード」や「バーコード」などで検索すると多くの無料アプリが見つかりますので、インストールしてください。
※「iPhone OS11」～は、標準のカメラで読みとることができます。

①3Dスキャナーに依る掘削イメージ図

